


## Information avseende projekt Västraby & Rögles vindkraftsparker

I det pågående projektet Rögles och Västraby vindkraftsparker ingår uppförande av grusvägar, byggnation av 13 vindkraftverk, 5 st i Västraby parken och 8 st i Rögles parken m.m.

### Grusvägar

Grusvägarna i Västraby parken är nu färdigställda. Arbetet med de grusvägar som uppförs i Rögles parken har startat i början av veckan (vecka 43) och beräknas pågå under ca 2 månader. Transporter av grus och övrigt materiel som krävs för byggnation av vägarna kommer att gå via väg 112 och sedan vidare via Tånga och Rögles. Återvändande lastbilar kommer att nå väg 112 huvudsakligen via Vålinge. Nämnade transporter beräknas trafikera dessa vägar primärt under vardagar, måndag-torsdag, mellan kl. 0600 och 1900. Vissa transporter under fredagar kan dock ej uteslutas i detta skede.

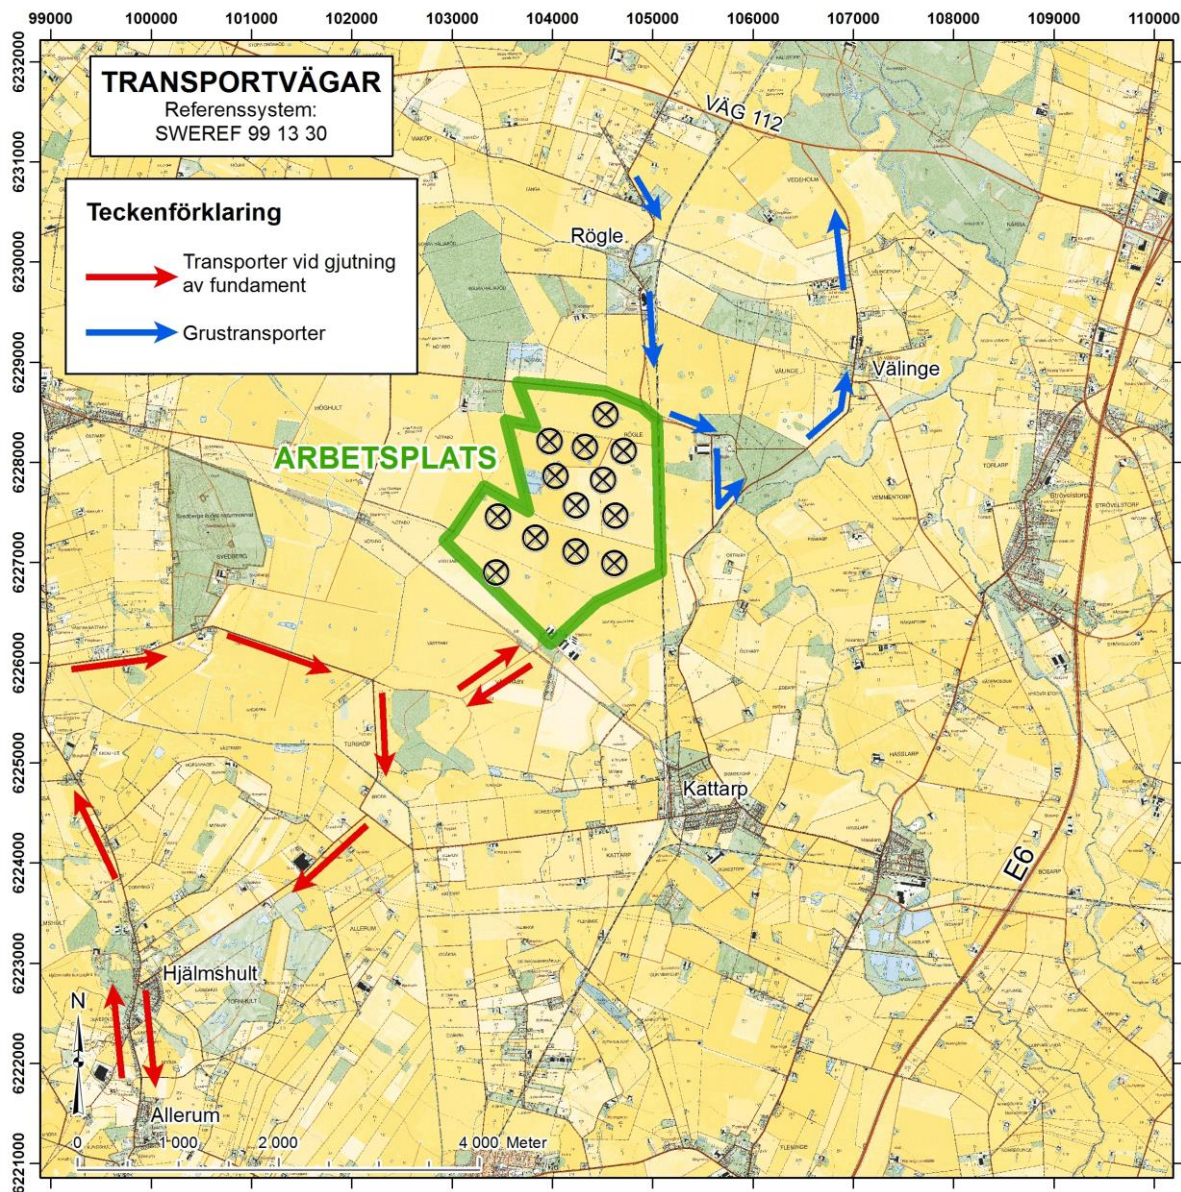

### **Pålning för fundament**

Pålningensarbetena i Västraby parken för betongfundament kommer att pågå fram till slutet av november. Efter ett kort avbrott flyttas denna verksamhet till Rögge parken. I Rögge parken kommer dessa arbeten att pågå (preliminärt) i ca 3 månader. Dessa arbeten medför viss bullerstörning vilket vi beklagar.

### **Gjutning av fundament**

Gällande tidplaner för de ovan nämnda vindkraftsparkerna indikerar att betongfundamenten i Västraby parken preliminärt kommer att uppföras under perioden mellan vecka 1444 och vecka 1451 och uppförandet av fundament i Rögge parken kommer att ske under perioden mellan vecka 1506 och vecka 1518. Detta innebär ett avbrott om 1,0 – 1,5 vecka mellan gjutningarna i Västraby respektive i Rögge parken. Gjutningen av varje fundament tar en dag.

Gjutningen av vart och ett av dessa fundament kommer att ske kontinuerligt under en max 12 timmar lång period. Varje gjutning kräver ett 60-tal betongtransporter vilka når arbetsområdet söderifrån, via Allerum, via Jonstorps- och Svedbergavägen. Återvändande bilar kommer att passera Turpköpsvägen och Allerum.

### **Transporter och installation av vindkraftverk**

Transporter av vindkraftverk och deras torn är aktuella under sommarmånaderna 2015. Efterföljande installation av vindkraftverk sker preliminärt mellan augusti och oktober 2015.

### **Projektets hemsida**

Korrigeringar av ovan nämnda tidplaner kommer att redovisas på projektets hemsida, [www.vardar.se](http://www.vardar.se), inte senare än en vecka innan start av respektive arbetsmoment.

På hemsidan finns också kontaktuppgifter till de personer som kan kontaktas för ytterligare information eller frågor antingen vi e-mail eller på telefon.

*Malmö 2014-10-20*

*Västraby & Rögge projektledning*

*För distribution av denna information anlitar vi posten och postens uppdelning av geografiska områden genom postnummer. Detta innebär att detta blad delas ut även till de hushåll som aldrig kommer att beröras av projektet eller dess transporter, t ex hushåll belägna öster om E6*
